



Zweckverband
Breitbandversorgung
Schwarzwald-Baar

Gemeinderat St. Georgen

„Sachstandsbericht Zweckverband
Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“

Jochen Cabanis

Geschäftsführer Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

St. Georgen am 21. Oktober 2020

Agenda

1. Übersicht Schwarzwald-Baar-Kreis
2. Laufende Maßnahmen
3. Ausblick

Netzentwicklung Backbone

-  **vorhanden / 2015 - 19 gebaut**
-  **vorübergehende Anmietung
Fremdnetze (Netcom)**
-  **in Bau / in Vorbereitung**
-  **Bau geplant / offen**




Netzentwicklung Ortsnetze

in Betrieb

Netzentwicklung Backbone

-  vorhanden / 2015 - 19 gebaut
-  vorübergehende Anmietung Fremdnetze (Netcom)
-  in Bau / in Vorbereitung
-  Bau geplant / offen

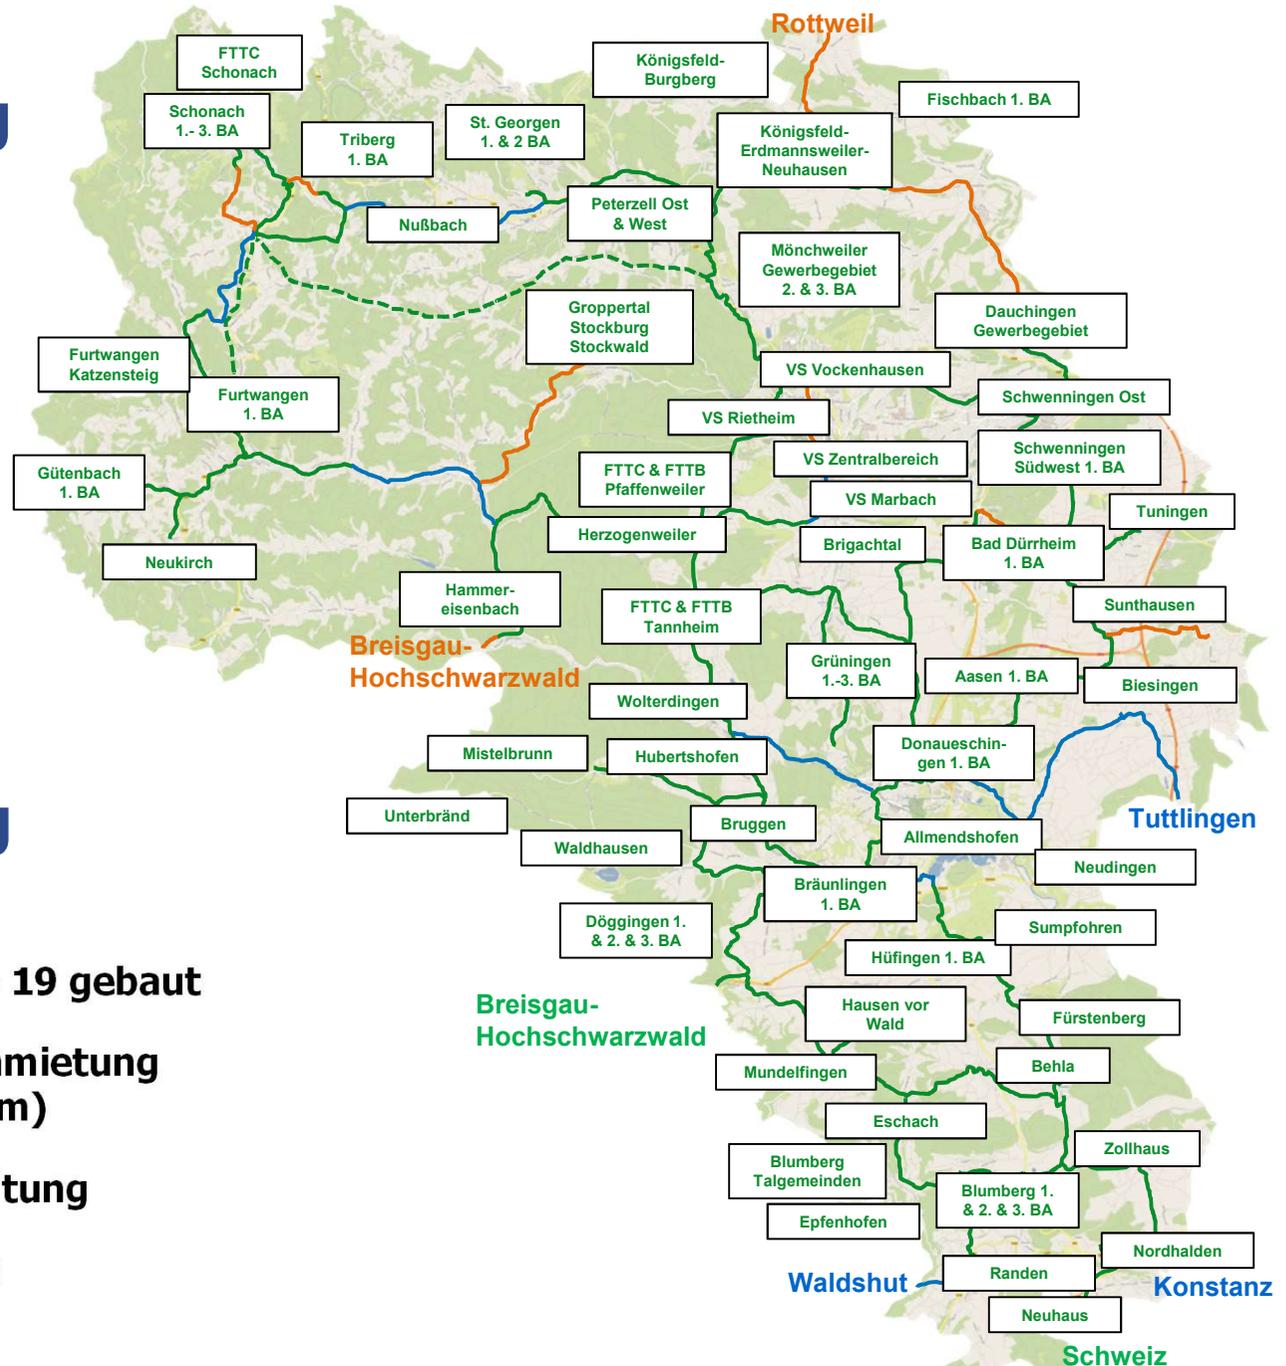

Vermarktung

Sommeraktion unseres Betreibers Stiegeler

Sommer-Aktion
ab **19,95** € mtl.
für die ersten
12 Monate*


Nähe

ist keine Frage
der Entfernung.

The advertisement features a large image of a smiling elderly woman with glasses on the left and a smiling baby on the right. Below these are four smaller images: an elderly man, a young man, a young woman, and a baby being held. The text 'Nähe ist keine Frage der Entfernung.' is overlaid in the center.

Vermarktung

Anschlüsse Juni 20 – Jahresziel >1 Mio. € Umsatz wird erreicht

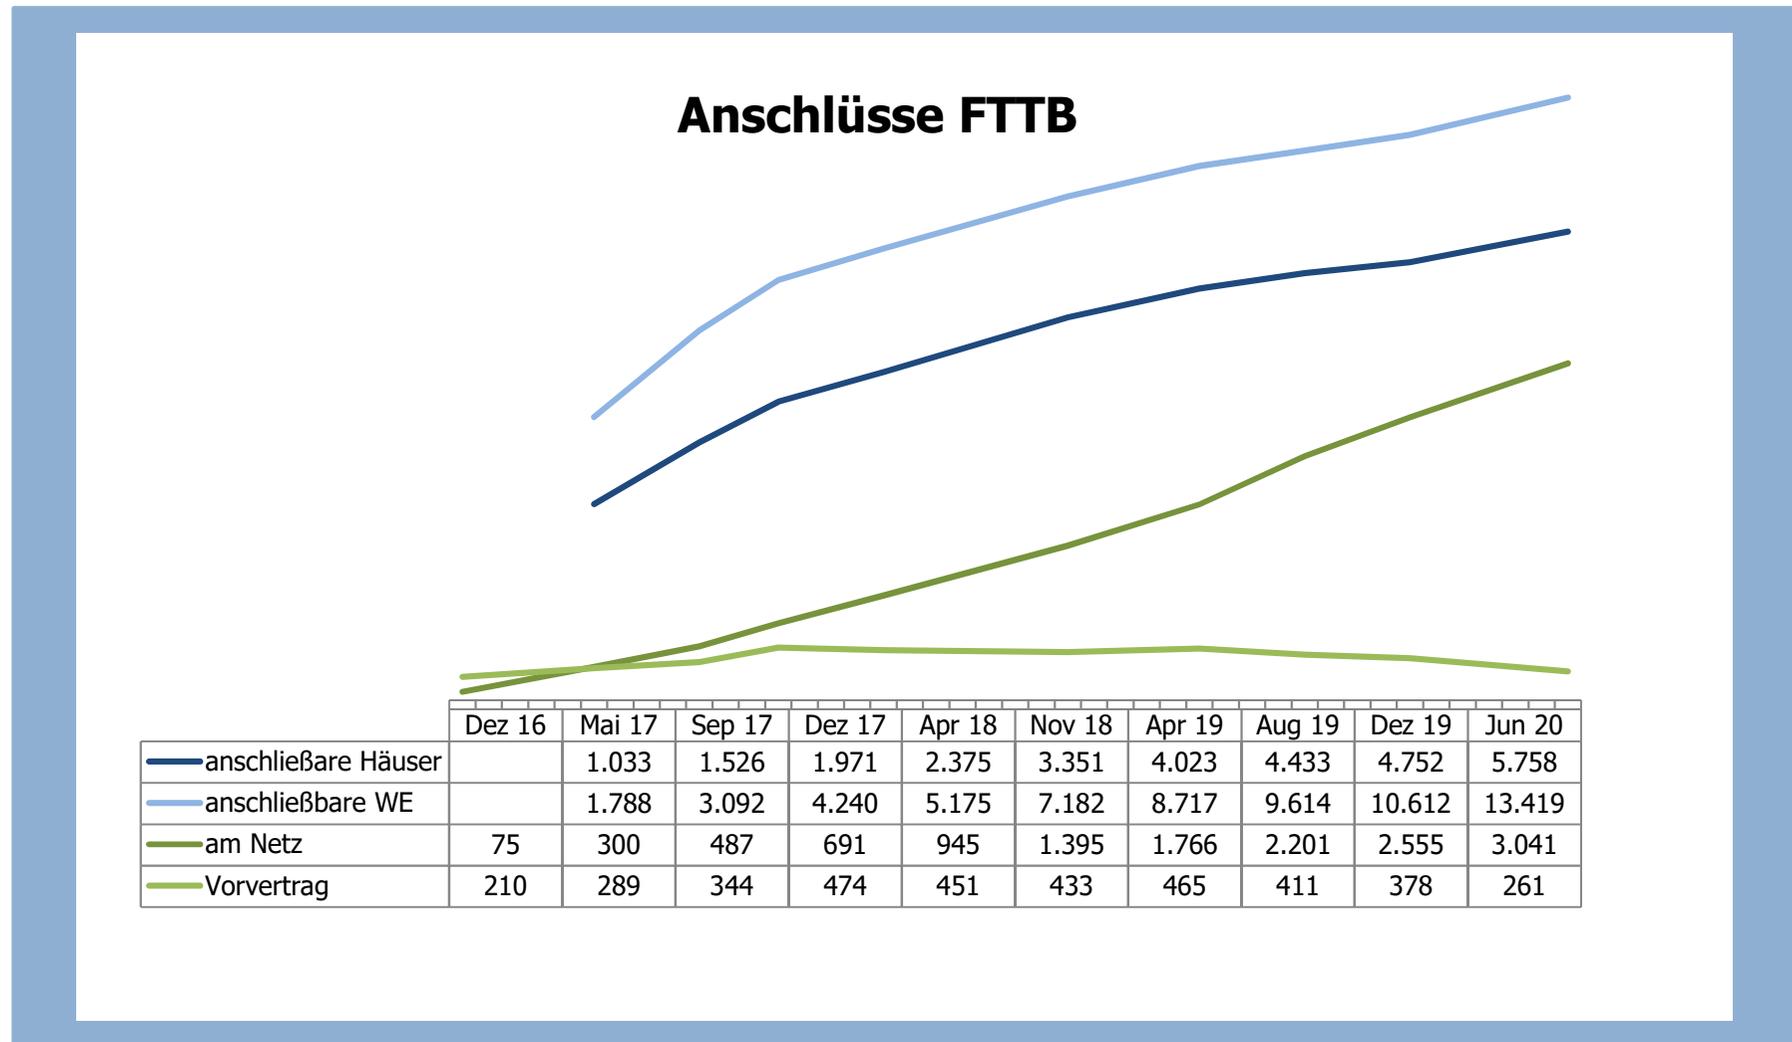

Stand Bundes- & Landesförderung seit Ende 2019

Nr.	Maßnahme	Antrag Bund - ateneKOM				Antrag bei Land - Mitfinanzierung				
		Antragsdatum	Fördersumme	Nachforderungen erhalten	vorläufiger Bescheid erhalten	Antragsdatum	Fördersumme	Eigenmittel	Förderbescheid erhalten	Gesamtfinanzierung
1	Blumberg Talgemeinden	15.07.2019	850.000,00 €	ja	14.10.2019	23.10.2019	680.000,00 €	170.000,00 €	07.02.2020	1.700.000,00 €
2	Gütenbach Kernort 2. BA & Außenbereich	17.07.2019	1.919.000,00 €	ja	05.11.2019	13.11.2019	1.535.200,00 €	383.800,00 €	07.02.2020	3.838.000,00 €
3	Bad Dür rheim Kernstadt 1. BA + 2. BA	17.07.2019	300.000,00 €	ja	04.11.2019	16.12.2019	240.000,00 €	60.000,00 €	18.03.2020	600.000,00 €
4	Schönwald Kernort 2. BA & Außenlieger	09.12.2019	2.595.831,00 €	ja	19.02.2020	09.03.2020	2.076.664,80 €	519.166,20 €		5.191.662,00 €
5	VS Anbindung Schulen (Sonderaufruf)	12.12.2019	3.335.500,00 €	-	21.02.2020	03.03.2020	2.668.400,00 €	667.100,00 €	26.06.2020	6.671.000,00 €
6	Schonach Kernort 3. BA & Außenbereich	16.12.2019	2.600.000,00 €	-	26.02.2020	06.03.2020	2.080.000,00 €	520.000,00 €		5.200.000,00 €
7	Blumberg - Fützen, Kommingen, Hondingen, Riedöschingen	17.12.2019	3.601.000,00 €	ja (27.01.2020)	08.06.2020	09.06.2020	2.880.800,00 €	720.200,00 €		7.202.000,00 €
8	Königsfeld - Glasbachtal (rechte Hälfte)	18.12.2019	600.500,00 €	-	19.02.2020	03.03.2020	480.400,00 €	120.100,00 €	26.06.2020	1.201.000,00 €
9	Furtwangen - Neukirch Außenbereich, Rohrbach und Linach	19.12.2019	2.578.853,00 €	ja (05.03.2020)	11.05.2020	15.05.2020	2.063.082,40 €	515.770,60 €		5.157.706,00 €
10	Triberg - Nußbach Außenbereich, Gremmelsbach und Teil Schonachbach	30.01.2020	4.200.000,00 €	ja (24.02.2020)	22.06.2020	25.06.2020	3.360.000,00 €	840.000,00 €		8.400.000,00 €
11	VS Gewerbegebiet Dickenhardt (Sonderaufruf)	04.02.2020	730.000,00 €	-	23.03.2020	27.03.2020	584.000,00 €	146.000,00 €		1.460.000,00 €
12	VS - Zollhaus	04.02.2020	450.000,00 €	ja (12.02.2020)	11.05.2020	15.05.2020	360.000,00 €	90.000,00 €		900.000,00 €
13	Königsfeld - Schulen	02.03.2020	218.586,00 €	-	20.07.2020	21.07.2020	174.868,80 €	43.717,20		437.172,00 €
14	Hüfingen - Weiße Flecken Außenbereich und Teil Kernstadt	03.03.2020	638.500,00 €	ja (16.03.2020)	17.06.2020	18.06.2020	510.800,00 €	127.700,00 €		1.277.000,00 €
15	Mönchweiler - Außenlieger	04.03.2020	375.000,00 €	-	20.07.2020	21.07.2020	300.000,00 €	75.000,00 €		750.000,00 €
16	Vöhrenbach - Außenlieger, Teil Kernstadt und Bregenbach 1-3	12.03.2020	2.615.000,00 €	-	17.06.2020	18.06.2020	2.092.000,00 €	523.000,00 €		5.230.000,00 €
17	Mönchweiler - Schule	24.03.2020	97.500,00 €	-	14.07.2020	14.07.2020	78.000,00 €	19.500,00 €		195.000,00 €
18	Vöhrenbach - Gewerbe (Sonderaufruf)	02.04.2020	369.642,00 €	-	10.08.2020	17.08.2020	295.713,60 €	73.928,40 €		739.285,58 €
19	Vöhrenbach - Schule (Sonderaufruf)	02.04.2020	50.000,00 €	-	31.08.2020					100.000,00 €
20	Donaueschingen - Haberfeld und Zindelstein	03.04.2020	350.000,00 €	-	13.07.2020	14.07.2020	280.000,00 €	70.000,00 €		700.000,00 €
21	VS - Obereschach	08.04.2020	1.650.000,00 €	ja (30.04.2020)	20.07.2020	21.07.2020	1.320.000,00 €	330.000,00 €		3.300.000,00 €
22	St. Georgen - 3. BA Galetsch und restliche Kernstadt	08.04.2020	2.350.000,00 €	-	13.07.2020	14.07.2020	1.880.000,00 €	470.000,00 €		4.700.000,00 €
23	St. Georgen - Peterzell Lückenschluss Haagenmoos bis Bahnlinie	08.04.2020	150.000,00 €	ja (30.04.2020)	27.07.2020	27.07.2020	120.000,00 €	30.000,00 €		300.000,00 €
24	Niedereschach Schabenhausen 1. BA Neubaugebiet	21.04.2020	275.000,00 €	-	20.07.2020	28.07.2020	220.000,00 €	55.000,00 €		550.000,00 €
25	Unterkirnach - Kernort 1. BA & Außenlieger	04.05.2020	1.100.000,00 €	ja (29.07.2020)	07.09.2020					2.200.000,00 €
26	Dauchingen - Kernort 1. BA & Außenlieger	08.05.2020	927.422,00 €	ja (04.06.2020)	10.08.2020	17.08.2020	741.937,60 €	185.484,40 €		1.854.844,00 €
27	Furtwangen Kernstadt 2. BA & Schönenbach & Schützenbach	11.05.2020	2.754.168,00 €	ja (04.06.2020)	03.08.2020	04.08.2020	2.203.334,40 €	550.833,60 €		5.508.336,00 €
29	Bad Dür rheim Ober- u. Unterbaldingen 1. BA & Immenhöfe	19.05.2020	1.376.805,00 €	-	03.08.2020	04.08.2020	1.101.444,00 €	275.361,00 €		2.753.610,00 €
30	Bräunlingen - Döggingen	27.05.2020	312.500,00 €	ja (08.06.2020)	03.08.2020	04.08.2020	250.000,00 €	62.500,00 €		625.000,00 €
31	Vöhrenbach - Linachtal Urachtal	28.05.2020	2.450.000,00 €	-	03.08.2020	04.08.2020	1.960.000,00 €	490.000,00 €		4.900.000,00 €
33	VS - Gewerbegebiete Villingen Süd	03.07.2020	1.000.000,00 €	ja (21.07.2020)	17.08.2020	18.08.2020	800.000,00 €	200.000,00 €		2.000.000,00 €
34	VS - Gewerbegebiet Krebsgraben Villingen	08.07.2020	536.676,00 €	-	31.08.2020					1.073.352,00 €
35	Donaueschingen - Schulen und Krankenhäuser (Sonderaufruf)	14.07.2020	781.032,00 €	-	31.08.2020					1.562.064,00 €
36	St. Georgen - Gewerbegebiet Seebauernhöhe	21.07.2020	300.000,00 €	-	17.08.2020	18.08.2020	240.000,00 €	60.000,00 €		600.000,00 €
37	Dauchingen - Sonderaufruf GWG Auf Firsten	29.07.2020	272.452,00 €	-	24.08.2020					544.904,00 €
38	Pföhren - Sonderaufruf GWG	19.08.2020	283.183,00 €	-	07.09.2020					566.366,00 €
39	Bad Dür rheim - Anbindung Kliniken	27.08.2020	32.987,00 €	ja						65.974,00 €
40	Hüfingen - Anbindung Schulen (Sonderaufruf)	31.08.2020	42.500,00 €	-	21.09.2020					85.000,00 €
41	Hüfingen - Gewerbegebiete (Sonderaufruf)	31.08.2020	111.000,00 €	-	21.09.2020					222.000,00 €
42	St. Georgen - Robert-Gerwig-Schule	31.08.2020	42.023,00 €	-	21.09.2020					84.046,00 €
43	Donaueschingen - Gewerbegebiete Kernstadt (Sonderaufruf)	01.09.2020	314.981,00 €	-	21.09.2020					629.962,00 €
44	Bad Dür rheim - Gewerbegebiete Öfingen und Hochemmingen (Sonderaufruf)	02.09.2020	804.619,00 €	-	05.10.2020					1.609.238,00 €
45	Furtwangen - GwG	21.09.2020	75.930,00 €	ja (30.09.2020)						151.860,00 €
46	Königsfeld - Glasbachtal West (Buchenberg)	30.09.2020	2.485.410,00 €							4.970.820,00 €
47	Königsfeld - Kernort Weißer Fleck	30.09.2020	332.015,00 €							664.030,00 €
	Gesamtsumme beantragt		49.235.615,00 €				33.576.645,60 €			
	Gesamtsumme erhalten		46.309.273,00 €				9.760.664,80 €			

Agenda

1. Übersicht Schwarzwald-Baar-Kreis
2. Laufende Maßnahmen
3. Ausblick

2. Laufende Maßnahmen

Baumaßnahmen 2020

- Fertigstellung Ausbaugebiet Halde
- Erweiterung um einen ersten Abschnitt (mehrere Anschlüsse) für die Wohnungsbaugesellschaft mit insgesamt 183 Wohneinheiten
- Nachzügler
- Mitverlegungen
 - Buchenweg
 - Weidenbächlestr.
 - Kühlbrunnenweg
 - Im Park
 - Erschließung Neubaugebiet 1. Bauabschnitt Glashöfe
- Vorbereitung der weiteren großen Baumaßnahmen für 2021

2. Laufende Maßnahmen

Auszug St. Georgen Bundesförderung

Nr.	Maßnahme	Antrag Bund - ateneKOM				Antrag bei Land - Mitfinanzierung				
		Antragsdatum	Teilnehmer	Fördersumme	vorläufiger Bescheid erhalten	Antragsdatum	Fördersumme	Eigenmittel	Förderbescheid erhalten	Gesamtfinanzierung
22	St. Georgen - 3.BA Galetsch und restliche Kernstadt	08.04.2020	500	2.350.000,00 €	13.07.2020	14.07.2020	1.880.000,00 €	470.000,00 €		4.700.000,00 €
23	St. Georgen - Peterzell Lückenschluss Haagenmoos bis Bahnlinie	08.04.2020	3	150.000,00 €	27.07.2020	27.07.2020	120.000,00 €	30.000,00 €		300.000,00 €
36	St. Georgen - Gewerbegebiet Seebauernhöhe	21.07.2020	8	300.000,00	17.08.2020	18.08.2020	240.000,00 €	60.000,00 €		600.000,00 €
42	St. Georgen - Robert-Gerwig-Schule	31.08.2020	1	42.023,00	21.09.2020					84.046,00 €
	Gesamtsumme beantragt			2.842.023,00			2.240.000,00 €			
	Gesamtsumme erhalten			2.842.023,00			- €			

Zwei weiterer Förderantrag in Vorbereitung für die Gebiete

- Oberkirnach, Langenschiltach (weiße Flecken - Außenbereich) und Brigach (weiße Flecken - Außenbereich)
- Zuführungsstrecke zum Neubaugebiet Glashöfe

Dieser wird bis Ende 2020 gestellt

2. Laufende Maßnahmen

Gründe für die Verzögerung

- Starke Fokussierung auf die Sicherstellung aller Förderanträge für den gesamten SBK – siehe Tabelle vorhin
- Planungsengpässe auf dem Markt, deshalb Einführung neuer Planungsbüros
- Neue Planungsbüros bedeuten immer erst einmal erhöhter Aufwand auch zeitlich, um die Zusammenarbeit reibungslos zu gestalten
- Vorgaben der Bundesförderung
 - Planung (ab der Feinplanung) müssen komplett neu aufgesetzt werden
 - Verlegte Leerrohre nach dem alten Materialkonzept benötigen Ausnahmegenehmigungen und müssen integriert werden
 - Erweitertes Faserkonzept

→ Anpassung der Ausbaustrategie z.B. für den Bereich „Galetsch, Seebauernhöhe und Ruppertsberg“ erforderlich

Agenda

1. Übersicht Schwarzwald-Baar-Kreis
2. Laufende Maßnahmen
3. Ausblick

3. Ausblick

Baumaßnahmen 2021

- Ausbau des gesamten Bauabschnitts Galetsch (wie ursprünglich geplant); aktuell läuft Ausführungs- und Genehmigungsplanung (Fertigst. Ende 21)
- Bauabschnitt Seebauernhöhe, Ruppertsberg und Außenbereich wird vorbereitet (Erstellung Hausanschlusspläne) mit über 600 Adressen (Bau 21 / 22)
- Lückenschluss Haagenmoos (Bau bis Ende 21)
- Anschluss Robert-Gerwig-Schule in 21
- Anschluss Neubaugebiet Glashöfe bis Ende 2021 auf direktem Weg

3. Ausblick

Zukünftige Förderung und weiterer Ausbau

- „Graue Flecken“ Förderung in 2 Stufen
 - 2021 ggf. schon viele Bereiche St. Georgens förderfähig
 - 2023 spätestens alle Anwesen in ganz St. Georgen
- Start des weiteren Ausbaus hängt grundsätzlich von den verfügbaren Ressourcen ab (u.a. Zweckverband, Planung, Baufirmen); bereits heute ist ein Ausbauvolumen von 120 Mio. € für den ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis für die Jahre 2021 bis 2024 in Vorbereitung (bis Jahresende komplett gefördert)
- Angang der Außenbereiche von Oberkirnach, Brigach und Langenschiltach in den Jahren 2022 bis 2025 in Abhängigkeit von den Ressourcen
- Restlicher Kernort St. Georgen und aller Teilorte frühestens ab 2023; in Abhängigkeit der Ressourcen zwischen 2024 und 2027

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

